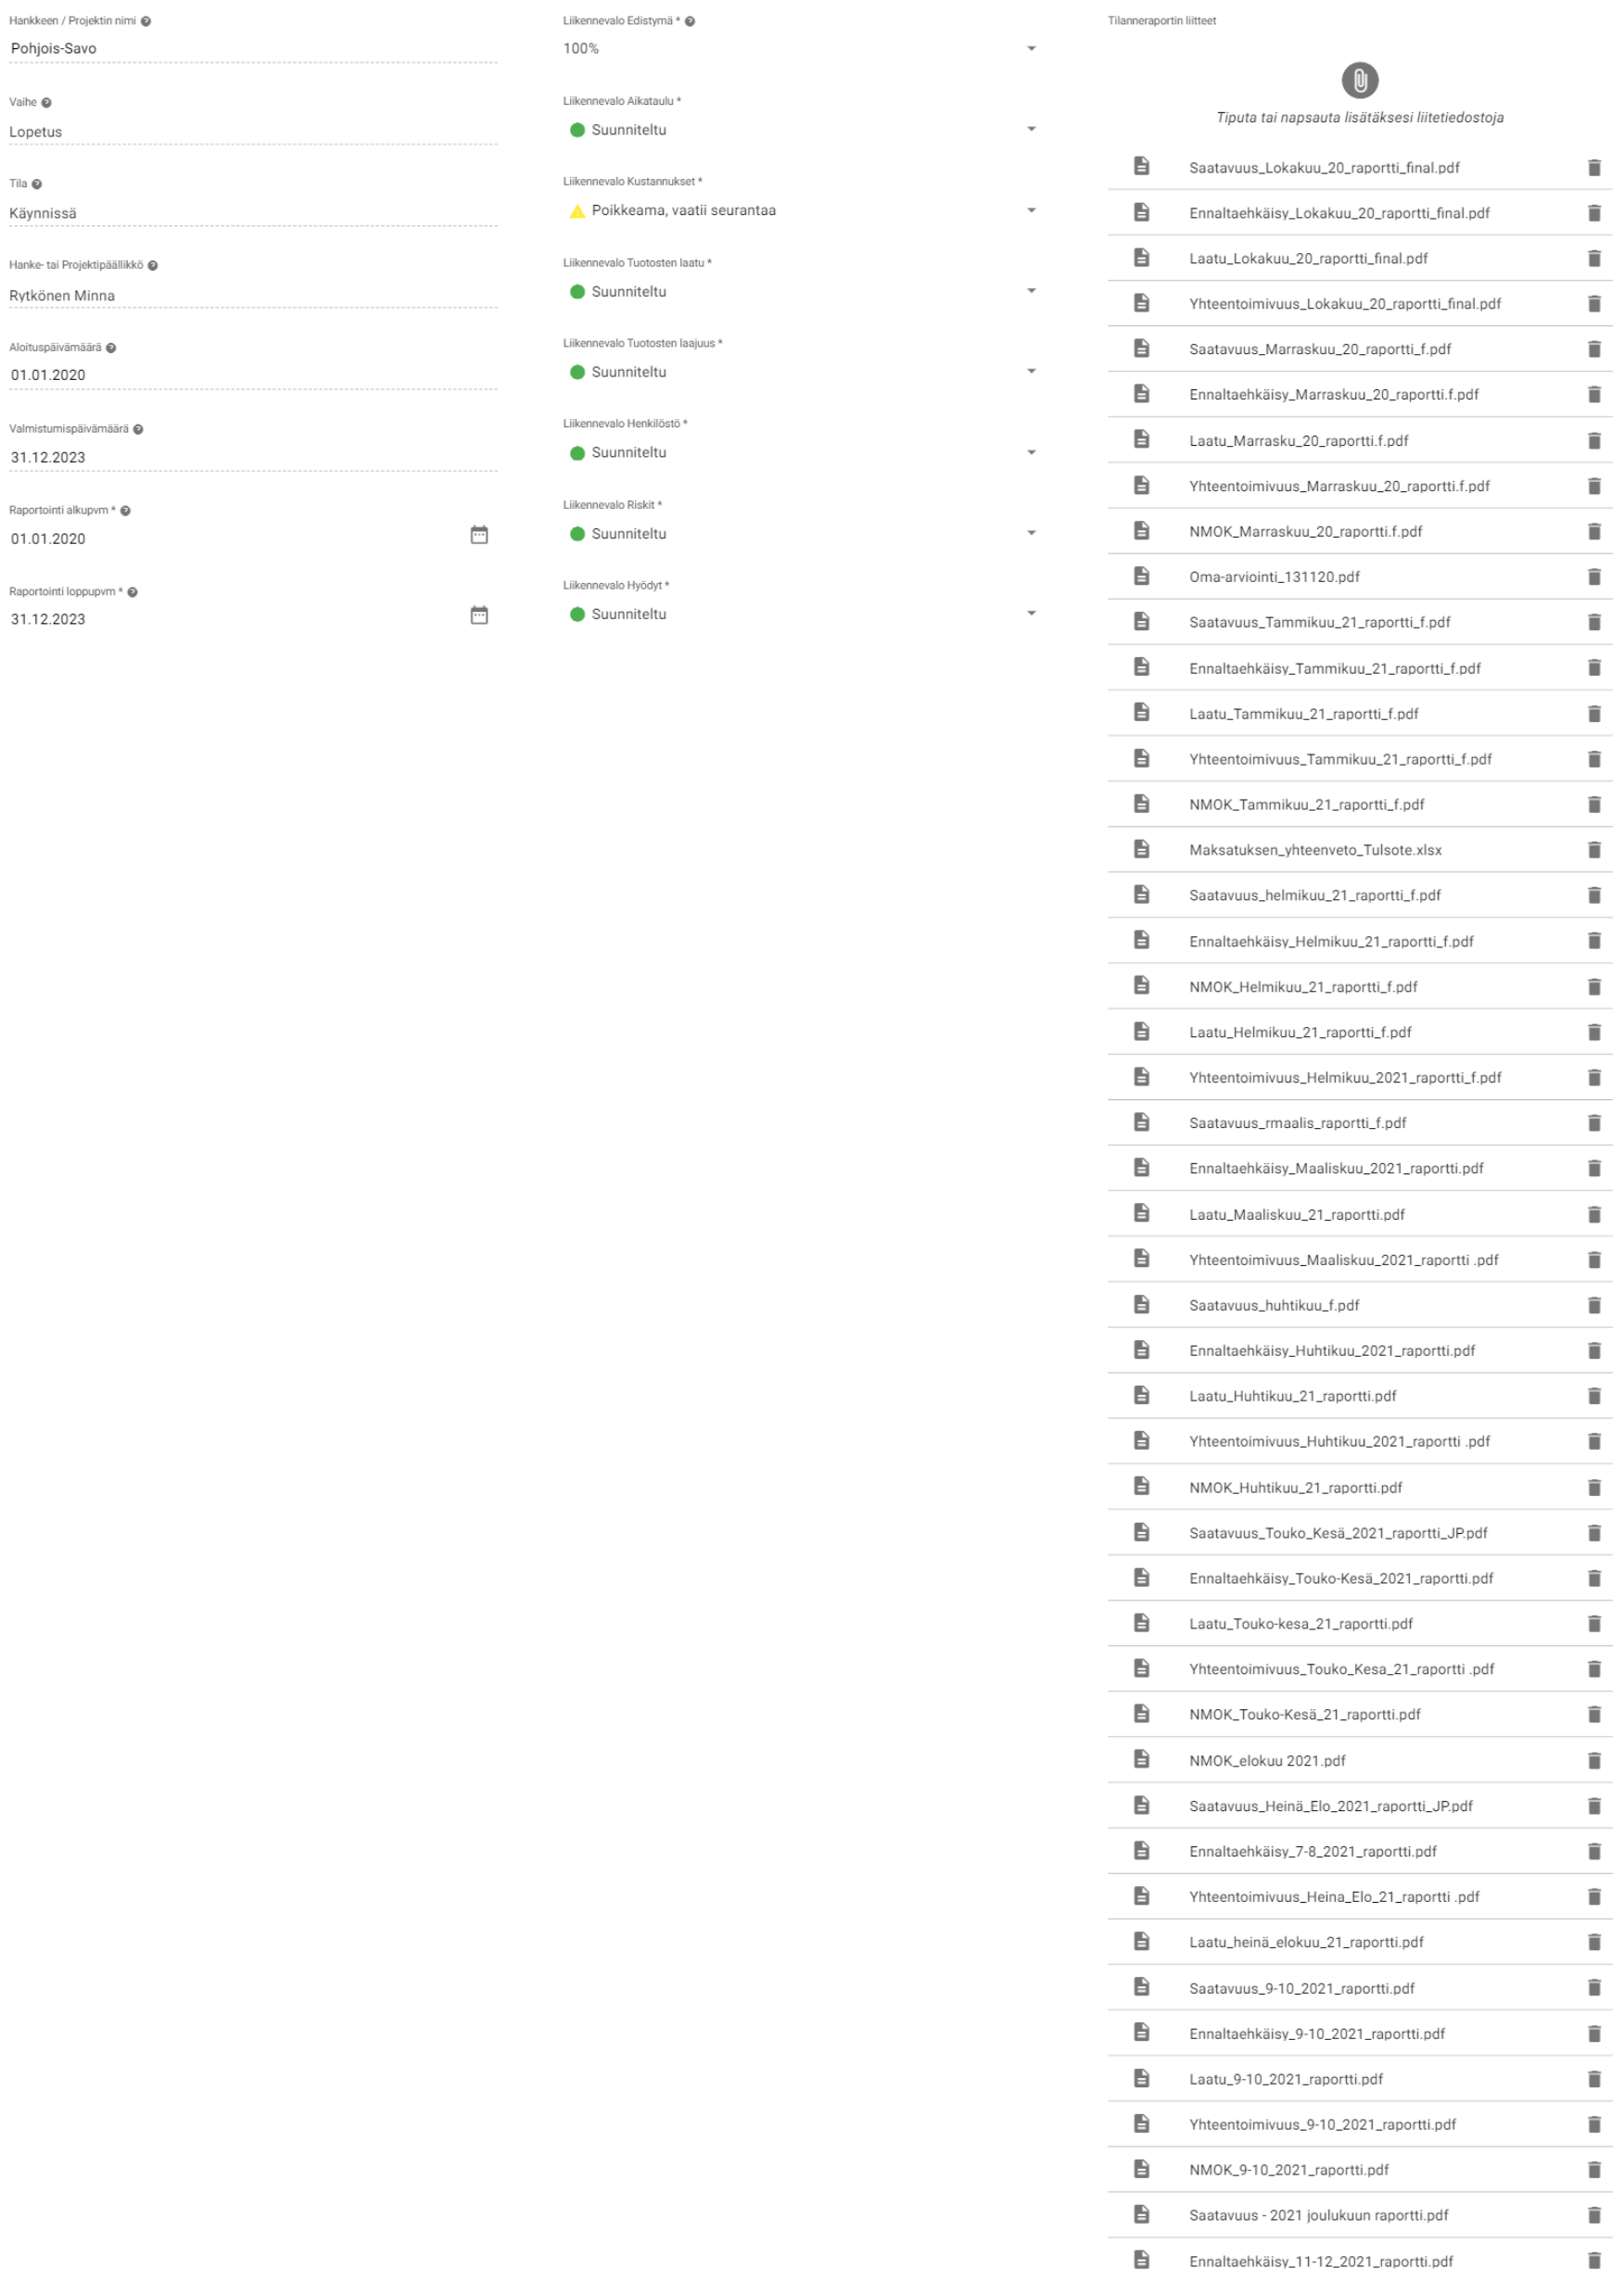

Hankkeen / Projektin nimi
Pohjois-Savo

Vaihe
Lopetus

Tila
Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö
Rytkönen Minna

Aloituspäivämäärä
01.01.2020

Valmistumispäivämäärä
31.12.2023

Raportointi alkupvm *
01.01.2020

Raportointi loppupvm *
31.12.2023

Liikennevalo Edistymä *
100%

Liikennevalo Aikataulu *
● Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset *
⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Tuotosten laatu *
● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *
● Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö *
● Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *
● Suunniteltu

Liikennevalo Hyödyt *
● Suunniteltu

Tilanneraportin liitteet

Tiputa tai napsauta lisätäksesi liitetiedostoja

- Saatavuus_Lokakuu_20_raportti_final.pdf
- Ennaltaehkäisy_Lokakuu_20_raportti_final.pdf
- Laatu_Lokakuu_20_raportti_final.pdf
- Yhteentoimivuus_Lokakuu_20_raportti_final.pdf
- Saatavuus_Marraskuu_20_raportti_f.pdf
- Ennaltaehkäisy_Marraskuu_20_raportti.f.pdf
- Laatu_Marrasku_20_raportti.f.pdf
- Yhteentoimivuus_Marraskuu_20_raportti.f.pdf
- NMOK_Marraskuu_20_raportti.f.pdf
- Oma-arviointi_131120.pdf
- Saatavuus_Tammikuu_21_raportti_f.pdf
- Ennaltaehkäisy_Tammikuu_21_raportti_f.pdf
- Laatu_Tammikuu_21_raportti_f.pdf
- Yhteentoimivuus_Tammikuu_21_raportti_f.pdf
- NMOK_Tammikuu_21_raportti_f.pdf
- Maksatuksen_yhteenveto_Tulsote.xlsx
- Saatavuus_helmikuu_21_raportti_f.pdf
- Ennaltaehkäisy_Helmikuu_21_raportti_f.pdf
- NMOK_Helmikuu_21_raportti_f.pdf
- Laatu_Helmikuu_21_raportti_f.pdf
- Yhteentoimivuus_Helmikuu_2021_raportti_f.pdf
- Saatavuus_rmaalis_raportti_f.pdf
- Ennaltaehkäisy_Maaliskuu_2021_raportti.pdf
- Laatu_Maaliskuu_21_raportti.pdf
- Yhteentoimivuus_Maaliskuu_2021_raportti .pdf
- Saatavuus_huhtikuu_f.pdf
- Ennaltaehkäisy_Huhtikuu_2021_raportti.pdf
- Laatu_Huhtikuu_21_raportti.pdf
- Yhteentoimivuus_Huhtikuu_2021_raportti .pdf
- NMOK_Huhtikuu_21_raportti.pdf
- Saatavuus_Touko_Kesä_2021_raportti_JP.pdf
- Ennaltaehkäisy_Touko-Kesä_2021_raportti.pdf
- Laatu_Touko-kesa_21_raportti.pdf
- Yhteentoimivuus_Touko_Kesa_21_raportti .pdf
- NMOK_Touko-Kesä_21_raportti.pdf
- NMOK_elokuu 2021.pdf
- Saatavuus_Heinä_Elo_2021_raportti_JP.pdf
- Ennaltaehkäisy_7-8_2021_raportti.pdf
- Yhteentoimivuus_Heina_Elo_21_raportti .pdf
- Laatu_heinä_elokuu_21_raportti.pdf
- Saatavuus_9-10_2021_raportti.pdf
- Ennaltaehkäisy_9-10_2021_raportti.pdf
- Laatu_9-10_2021_raportti.pdf
- Yhteentoimivuus_9-10_2021_raportti.pdf
- NMOK_9-10_2021_raportti.pdf
- Saatavuus - 2021 joulukuun raportti.pdf
- Ennaltaehkäisy_11-12_2021_raportti.pdf

- NMOK_joulukuu 2021.pdf
- Laatu_marraskuu_joulukuu_21_raportti.pdf
- Yhteentoimivuus_Marras_Joulu_21_raportti (1).pdf
- Hankevoimala_PSHVA_esittely.pptx

Tilanneraportin linkit

Lisää linkki

- NMOK tiedote
- POSOTE20 sivut
- Tiedote hankkeen käynnistymisestä
- THL arvio Pohjois-Savon sotepalvelujen järjestämistä
- Perhekeskusmalli käyttöön koko Pohjois-Savon alueella
- Uutiskirje marraskuu (1)
- Uutiskirje marraskuu (2)
- POSOTE20 blogi: Lasten ja nuorten mielenterveyden
- Hyötytavoitteiden kansallinen seuranta mittaristo
- Uutiskirje joulukuu
- POSOTE20 blogi: Pohjois-Savossa palveluja uudistetaan
- Ennaltaehkäisevillä palveluilla tavoitellaan parempaa arkea
- Sote-uudistuksen vapaaehtoinen valmistelu käynnistyi
- Uutiskirje tammikuu 27.1.
- Nuorten mielialaoireisiin varhaista apua
- Keskiössä asiakkaan tarpeet
- Suupirssi
- Asiakaslähtöinen työvuorosuunnittelu
- Uutiskirje helmikuu
- POSOTE20 blogi joustavasta asioinnista
- Lasten nuorten ja perheiden OT keskus
- POSOTE20 blogi: Otetaan alkoholi puheeksi
- Monialaisen tiimityön mallin kehittäminen Varkaudessa
- Huhtikuun uutiskirje
- Järjestöt osaksi sotepalveluja
- Soteuudistuksen sanasto savoksi
- Yhteentoimivuus työpaketin tiedote
- Pohjois-Savo valmiina soteuudistuksen toimeenpanoon
- Uutiskirje toukokuu
- Blogi Työttömillä oikeus terveystarkastuksiin
- Uutinen: Asukkaiden näkemys tärkeä palvelujen
- Uutinen: Palvelujen kehittämisessä panostetaan
- Blogi: Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy (7.9.2021)
- Blogi: Monialainen yhteistyö kantaa hedelmää (8.9.2021)
- Uutinen: Tietojohtamisen palvelutuotannon perusta
- SavoGrow kuntien alueella kokeillaan verkostomaista
- Uutinen: Uudenlaista yhteistoimintaa lasten ja nuorten
- Blogi: Asiakkaille hyvinvointia yhdessä
- Blogi: Lähisuhdeväkivalta
- Blogi: Elintapaohjaus - paljon hyvää Pohjois-Savossa
- Blogi: Yhtenen aika perheen tukena
- Blogi: Mörkö voidaan voittaa yhdessä
- Blogi: Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen toimivuus
- Blogi: Tanssiin kutsu

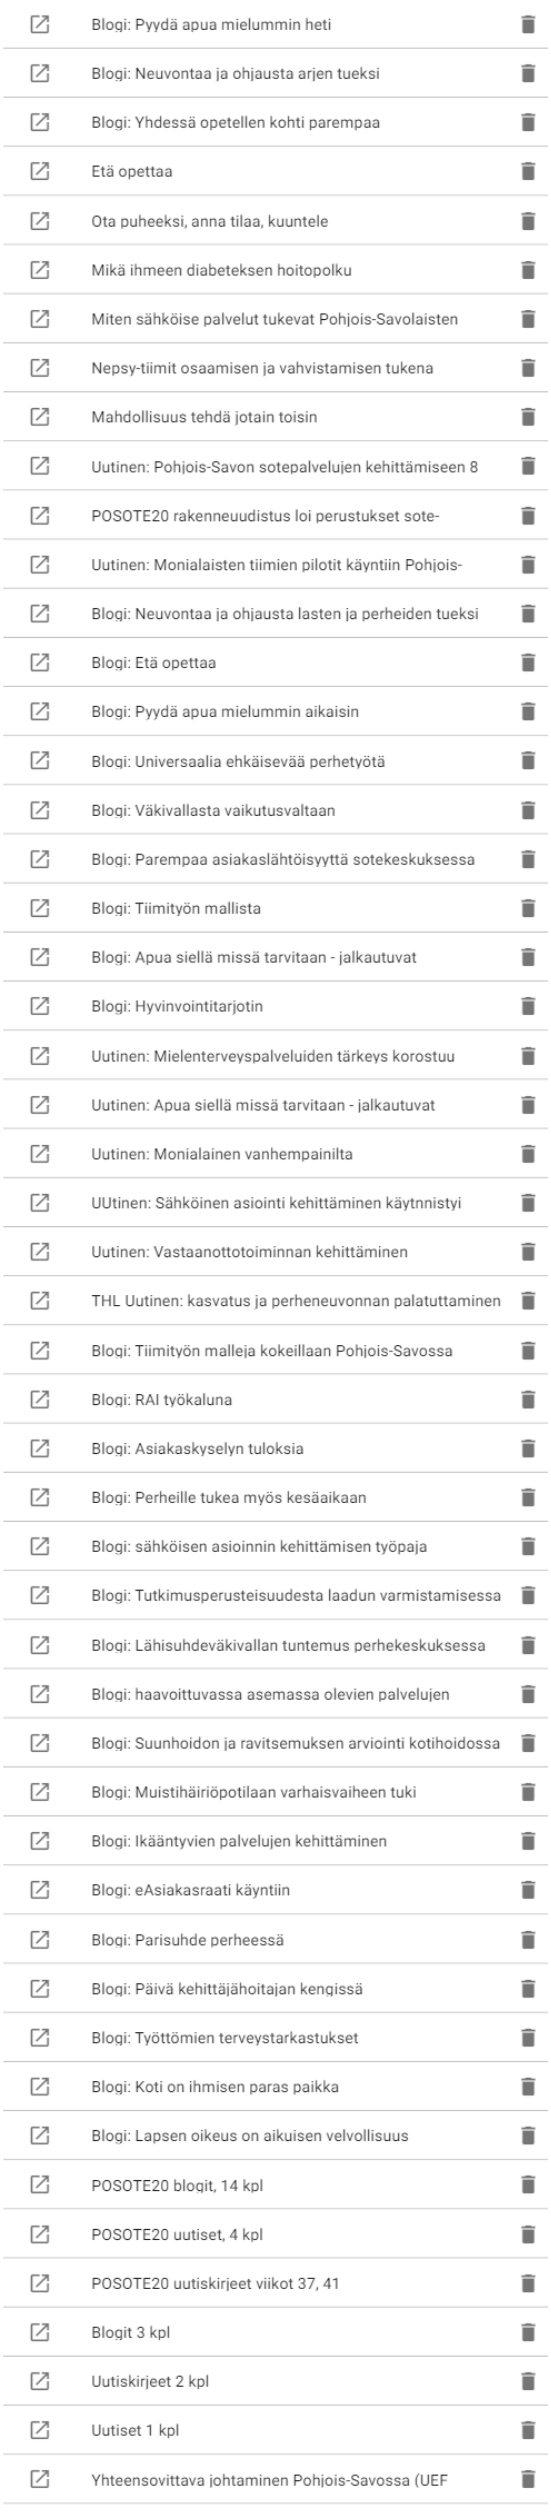

Blogi: Pyydä apua mielummin heti
Blogi: Neuvontaa ja ohjausta arjen tueksi
Blogi: Yhdessä opetellen kohti parempaa
Etä opettaa
Ota puheeksi, anna tilaa, kuuntele
Mikä ihmeen diabeteksen hoitopolku
Miten sähköise palvelut tukevat Pohjois-Savolaisten
Nepsy-tiimit osaamisen ja vahvistamisen tukena
Mahdollisuus tehdä jotain toisin
Uutinen: Pohjois-Savon sotepalvelujen kehittämiseen 8
POSOTE20 rakenneuudistus loi perustukset sote-
Uutinen: Monialaisten tiimien pilotit käyntiin Pohjois-
Blogi: Neuvontaa ja ohjausta lasten ja perheiden tueksi
Blogi: Etä opettaa
Blogi: Pyydä apua mielummin aikaisin
Blogi: Universaalia ehkäisevää perhetyötä
Blogi: Väkivallasta vaikutusvaltaan
Blogi: Parempaa asiakaslähtöisyyttä sotekeskuksessa
Blogi: Tiimityön mallista
Blogi: Apua siellä missä tarvitaan - jalkautuvat
Blogi: Hyvinvointitarjotin
Uutinen: Mielenterveyspalveluiden tärkeys korostuu
Uutinen: Apua siellä missä tarvitaan - jalkautuvat
Uutinen: Monialainen vanhempainilta
UUtinen: Sähköinen asiointi kehittäminen käytnnistyi
Uutinen: Vastaanottotoiminnan kehittäminen
THL Uutinen: kasvatus ja perheneuvonnan palatuttaminen
Blogi: Tiimityön malleja kokeillaan Pohjois-Savossa
Blogi: RAI työkaluna
Blogi: Asiakaskyselyn tuloksia
Blogi: Perheille tukea myös kesäaikaan
Blogi: sähköisen asioinnin kehittämisen työpaja
Blogi: Tutkimusperusteisuudesta laadun varmistamisessa
Blogi: Lähisuhdeväkivallan tuntemus perhekeskuksessa
Blogi: haavoittuvassa asemassa olevien palvelujen
Blogi: Suunhoidon ja ravitsemuksen arviointi kotihoidossa
Blogi: Muistihäiriöpotilaan varhaisvaiheen tuki
Blogi: Ikääntyvien palvelujen kehittäminen
Blogi: eAsiakasraati käyntiin
Blogi: Parisuhde perheessä
Blogi: Päivä kehittäjähoitajan kengissä
Blogi: Työttömien terveystarkastukset
Blogi: Koti on ihmisen paras paikka
Blogi: Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus
POSOTE20 blogit, 14 kpl
POSOTE20 uutiset, 4 kpl
POSOTE20 uutiskirjeet viikot 37, 41
Blogit 3 kpl
Uutiskirjeet 2 kpl
Uutiset 1 kpl
Yhteensovittava johtaminen Pohjois-Savossa (UEF

- POSOTE20 blogit 10 kpl
- I vaiheen loppuraportti
- Uutiskirje
- POSOTE20 blogi 6 kpl
- Mielipide Hankehumppaa vai vakavasti otettava
- POSOTE20 Yhteenvetoraportti_infograafit
- Hankveoimala
- Hankevoimalan podcastsarja
- Terveyskeskuksen vastaanottopalvelujen tiimityönmalli
- Sotekeskuksen tiimiityön malli - MOTI-tiimi
- Järjestöjen toimintaa kokoava hyvinvointitarjotin
- Tutkimuksellisuus sotekeskuksessa
- Digihoitopolkujen käyttöönotto
- Digitaalisten palvelujen käyttöön otto
- Ikääntyvien omaishoitajien hyvinvointitarkastukset
- Ravitsemuksen ja suunterveyden arvioinnin ja omahoidon
- Kotisairaalamalli harvaanasutulla alueella
- Miepäkuntoutujien tiimimalli
- Sosiaali ja terveyspalvelujen tilannekeskus
- Ikäkeskuksen palvelulupaus
- Kasvatus- ja perheneuvonnan ammatillisen johtamisen
- Perhekeskuksen monitoimijainen yhteistyömalli (Yhdessä
- Perhekeskuksen keskitetty ohjaus- ja neuvontamalli
- Lastensuojelun systeeminen malli ja monitoimijainen
- Etäperhevalmennuksen suunnitelma
- Vanhemmuuden ryhmämuotoinen tuki
- Varhaisen tuen mallit perhekeskuksessa
- Perhekeskusmentelmien implementointimalli
- Perhekeskustoimintamalli
- Neuvolan perhetyön pilotti
- Maksuttoman raskauden ehkäisyn selvitys
- Nepsytiimimalli
- Nuorten jalkautuva mielenterveustyö
- Osallisuusohjelma
- Kokemusosaajamalli

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Hanke eteni pääosin suunnitellusti ja saavutti sille asetetut tavoitteet varsin haasteellisista ajoista huolimatta. Kansallisten hyötytavoitteiden ja niitä kuvaavien mittareiden valossa ei voida kovinkaan painokkaasti osoittaa, että saatavuus, painopisteen siirtyminen ennaltaehkäisyyn, laatu ja vaikuttavuus tai yhteentoimivuus ja monialaisuus olisivat parantuneet. Muutokset on enemmän alueellisia, joita kansalliset mittarit eivät näytä. Kansallisten mittareiden ongelma on myös se, että niiden luvut tulevat auttamatta jäljessä (pääosin vuoden 2022 tietoja). Hyötyjen toteutuminen on toistaiseksi alueellisten kokeilujen ja käyttöön ottojen kokemusten pohjalta arvioituja. Kokonaisuutena merkittävä hyöty on se, että kokeilujen myötä on tunnistettu toimivia käytäntöjä, joiden pohjalta toimintaa laajennetaan ja rakenteita kehitetään. Erityisesti olemme onnistuneet digitaalisten palvelujen ja etäasioinnin edistämisessä, monialaisen asiakastyön parantamisessa, neuvonnan ja ohjauksen vahvistamisessa ikääntyvien ja perheiden palveluissa, ennaltaehkäisevien toimintamallien tuottamisessa ja kotisairaanhoitomallin laajentamisessa. Merkittävä hyöty hyvinvointialueen palvelu-uudistukseen on myös ollut tiedolla, joka tuotettiin hoitotakuuseen valmistautumisen tueksi. Mallit, jotka vaativat lisäresursointia tai sosiaalialan ammattilaisen työpanoksen kohdentamista muuhun kuin lakisääteiseen työhön, eivät jatkuneet sellaisenaan huolimatta hyvistä tuloksista. Kehittämistyö ja toimintamallien laajentaminen jatkuu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimesta sekä RRP2 hankkeen tuella. Toivomme myös että RRP4 saisi rahoituksen Omatiimi-mallin käyttöön ottoon.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Poikkeamana suunnitellusta rahoitusta jäi käyttämättä yli 1,5 milj. Tämä oli pitkälti seurausta koronan seurauksista ja rekrytointien viivästymisestä. Suunnitelmia päivitettiin, mutta osaa uusista suunnitelmista ei pystytty toteuttamaan sellaisenaan, johtuen puutteellisista henkilöstöresursseista, tuotannon kuormittuneesta tilanteesta ja hva:n linjausten muutoksista/puuttumisesta.

Kaikkiaan hankkeen etenemistä kuormitti hyvinvointialueelle siirtyminen ja uuteen asettuminen. Tässä oli turhan paljon samanaikaista kehittämistä yhdellä kertaa tehtäväksi.

Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne, henkilöstöresurssien puuttuminen, yleinen uupuminen ja kiire sekä kriisitietoisen ilmapiirin vahvistuminen, ovat uhkia myönteisen ja kestävän muutoksen etenemiselle. Toisaalta vahva tahtotila ja yhteinen ymmärrys siitä, että toiminnallinen muutos tarvitaan, on vienyt ja vie edelleen muutosta eteenpäin. Strategia tukee vahvasti yhteistä suuntaa. Hyvinvointialueiden voimavara ja resurssi tässä muutoksessa on ihmisen sisältä kumpuavassa halussa kasvaa, rakentaa yhteyksiä ja oppia yhdessä sekä toimia osana yhteistä tehtävää ratkaisijan roolissa.

Muutostyö jatkuu edelleen. Hyvinvointialue hyötyisi vielä painotetusta jatko-ohjelmasta ja rahotuksesta toiminnallisen ja kulttuurisen muutoksen edistämiseksi.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

HOITOON PÄÄSYN PARANTAMINEN

VASTAANOTTOPALVELUT, ENNALTAEHKÄISY JA MONIALAINEN TYÖ

- Otettu käyttöön terveyskeskuksen vastaanottopalvelujen tiimityön malli. Jää toimintaan Pohjoisella alueella 7 tiimissä.
- Otettu käyttöön sotekeskuksen laajojen asiakkuuksien tiimityön malli (Moti-tiimi). Jää toimintaan Eteläisellä alueella ja laajennetaan koko hva:lle RRP2 hankkeen tuella. Moti-tiimin vaikuttavuutta tutkitaan RRP3 hankkeessa (2024–2025).
- Osana tiimimallia kokeiltu asiakaskoordinaattorimallia. Mallia räätälöidään olemassa oleviin resursseihin sopivaksi. Tällaisenaan ei toteuteta myönteisistä tuloksista huolimatta.
- Tuotettu tutkimus monialaisen tiimityön haasteista yhteistyössä UEF kanssa (tieteellinen julkaisu tulossa). Tutkimusyhteistyö jatkuu ja yhteistyön tapoja vahvistetaan.
- Otettu käyttöön järjestöjen toimintaa kokoava Hyvinvointitarjotin ohjauksessa (rahoitus ainakin 2024 vuodelle, jatko selviää RRP2 hyte-palvelutarjotin (Tarmoa) kokonaisuuden edetessä.
- Tuotettu työparityö- ja sosiaaliohjaus terveysasemalla malli. Myönteisistä tuloksista huolimatta mallia ei jatketa (ainakaan toistaiseksi), koska heikot sosiaalityön resurssit kohdennetaan lakisääteisiin palveluihin.
- Tuotettu hva:lle keskitetty neuvonta- ja ohjausmalli. Malli vielä käytössä. Vaatii hva:lla vielä strategista vahvistamista, päätöksentekoa ja mallin hiomista.

VASTAANOTTOPALVELUJEN SELVITYS

- Viimeisellä raportointikaudella vietiin tehtävät loppuun ja varmistettiin jatkot tarvittavilta osin.
- Tuotettu alueellinen palvelutarveanalyysi.
- Tuotettu nykytilan kuvaus vastaanottotoiminnasta hoitotakuun valmistautumisen tueksi: a) yhteydenottojen volyymit, sisällöt ja kysyntä, b) hoitotyön toiminnot vastaanotolla, c) hoidon tarpeen arviointi, toimenpidekoodit ja käyntisyiden kirjaamistarpeet, d) fysioterapeuttien suoravastaanotto ja asiakkaiden ohjautuminen omaolon kautta ja e) kiireettömän hoidon kiireellisyysluokitus
- Tuotettu selvitys lääkäreiden sektorityöstä.
- Selvitysten tuloksia hyödynnetään palvelutuotannon suunnittelussa 2024–25.

PSYKOSOSIAALISET MENETELMÄT KAIKENIKÄISILLE: Valmis

- Tuotettu selvitys työikäisten ja ikääntyvien psykososiaalisen hoidon haasteista, menetelmistä ja koulutustarpeista. Hyödynnetty Terapiat etulinjaan-hankkeen jatkotyössä ja päätöksenteossa

SÄHKÖINEN ASIOINTI JA DIGIHOITOPOLUT:

- Viimeisellä raportointikaudella vietiin tehtävät loppuun ja varmistettiin jatkot tarvittavilta osin.
- Otettu käyttöön hyvinvointialuetasoiset, perus- ja erityistason palvelut yhdistävät diabeteksen ja valtimotaudin digihoitopolut
- Otettu käyttöön Tulppa-verkkovalmennus osana valtimotautipotilaiden sydänkuntoutusta
- Laajennettu etävastaanottoja: nuorisopsykiatrian poliklinikka, Ikäkeskuksen palveluohjaus ja muistipoliklinikka, perhekeskuksen läntinen alue, perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvojat), työikäisten sosiaalipalvelut
- Otettu käyttöön chat-palvelu ikäkeskuksen neuvonnassa
- Jatketaan digitaalisten palveluiden käytön laajentamista sekä jatkokehittämistä 2024–2025 erityisesti RRP2 hankkeessa. Lisäksi digitaalisten palveluiden valikoimaa kasvatetaan, ottamalla käyttöön mm. Omaperhe-palvelu ja oirearviopalvelu Omaolo sekä vahvistamalla ammattilaisten ja asukkaiden digirohkeutta ja digitaitoja.
- Tuotettu lääkärin etätyön malli

IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTI, TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA MONIALAINEN KUNTOUTUS

- Moniammatillinen (MONNI) toiminta laajentui eteläisen alueelle entisen Ylä-Savon Soten mallia hyödyntäen. Koillisen alueen toimintamalli valmistui ja käynnistyy vuoden 2024 alkupuolella. Läntisen ja keskisen alueen moniammatilliset käynnistyvät myös 2024
- Lyhytaikaispaikkojen nykytila ja asiakasprofiilit HVA:lla on selvitetty. Tunnistettu ja huomioitu kehittämisen tarpeet 2024.
- Tuotettu asiakasohjauksen nykytilan ja toimivuuden selvitys, jonka pohjalta laaditaan keskitetty toimintamalli hyvinvointialueelle asiakasohjauksen uudistamisen projektissa 2024–25.
- Tuotettu esitys kotisairaalamallista hva:lle.
- Tuotettiin ikääntyneiden omaishoitajan hyvinvoinnin ja terveystarkastuksen toimintamalli. Kehittäminen ja käyttöönotto jatkui Tulkoti hankkeessa 2023. Omais- ja perhehoidon tukea kehitetään edelleen RRP2 hankkeessa 2023–25.
- Tuotettiin ravitsemuksen ja suunterveyden arvioinnin ja omahoidon ohjauksen toimintamalli. Kehittäminen ja käyttöönotto jatkui Tulkoti hankkeessa 2023.
- Tuotettiin kotisairaalamalli harvaan asutulle alueelle. Pilottien pohjalta toiminta jatkuu. Kotisairaalamallin kehittäminen ja laajentaminen jatkuu palvelualueella 2024–25.
- Tuotettiin miepä-kuntoutujien keskitetty tiimimalli kotihoidossa. Toimintamallin jalkauttamista jatketaan palvelutuotannossa.
- Tuotettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekeskusmalli. Toimintamalli käytössä.
- Tuotettu ikäkeskuksen palvelulupaus ja palvelusisällöt.
- Tuotettu kotiutusyksikköselvitys, jonka pohjalta tehdään esitys toiminnan perustamisesta hva:lle

LAPE

LASTEN JA PERHEIDEN ENNALTAEHKÄISEVÄ JA VARHAINEN TUKI ARKEEN

- Viimeisellä raportointikaudella vietiin tehtävät loppuun ja varmistettiin jatkot tarvittavilta osin.
- Otettu käyttöön kasvatus- ja perheneuvonnan matalan kynnyksen ja johtamisen toimintamalli Läntiselle alueelle. Henkilöstön osaamista vahvistettiin näyttöön perustuvin menetelmin (mm käynti kerrallaan). Toimintamalli jäi käyttöön ja sitä laajennetaan koko hva:lle 2023–24.
- Otettu käyttöön monitoimijainen malli, Yhdessä-aika, kaikilla alueilla. Tuotettu seuranta- ja asiakaspalautemateriaali johdon käyttöön. Jatkuu pysyvänä toimintana.
- Tuotettu perhekeskuksen keskitetty ohjaus- ja neuvontamalli. Käyttöönottoa jatketaan RRP2 hankkeessa lapsiperheiden yleisenä neuvontana.
- Tuotettu neuvolan perhetyön pilotti. Malli todettu tarpeelliseksi. Toiminta ei jatku, koska resurssit ohjataan lakisääteisiin tehtäviin.
- Edistetty lastensuojelun systeemistä toimintamallia koulutuksin (n=98) sekä sparraamalla tiimejä ja johtoa. Mallin juurtumisen taso ja käyttöönoton haasteet vaihtelevat alueittain. Ohjausryhmä jatkaa hva:lla käyttöönoton tukea.
- Edistetty ja otettu käyttöön näyttöön perustuvien vanhemmuuden tuen menetelmiä, yht. 396 hlö: Lapset puheeksi, Adhd-Strategia, Varhainen vuorovaikutus ja Vahvuutta vanhemmuuteen. Lisäksi muut valmennukset, yht. 640 hlö: parisuhteen puheeksi otto, lähisuhdeväkivallan perehdytys ja tilaisuudet n yht 1200 hlö. Menetelmäkoordinaatio jatkuu hva:lla.
- Tuotettu perhekeskuksen toimintasuunnitelma (THL linjausten mukaan) monialaisena työnä perhekeskusalueiden kanssa. Suunnitelma päätöksentekorakenteissa hyväksytty ja varmistaa osaltaan menetelmien käytöstä ja toimintamallien jatkuvuuden.

MAKSUTTOMAN RASKAUDEN EHKÄISYN SELVITYS

- Viimeisellä raportointikaudella vietiin tehtävät loppuun ja varmistettiin jatkot tarvittavilta osin.
- Tuotettu seksuaaliterveysneuvonnan selvitys sekä toimintasuunnitelma ja -ohje. Otettu käyttöön ja viety IMS-järjestelmään ammattilaisten hoito- ja työohjeiksi. Työryhmä jatkaa palvelutuotannossa.
- Vahvistettu seksuaaliterveysneuvonnan osaamista (yht 167 hlöä)

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN TUKI JA HOITO

- Viimeisellä raportointikaudella vietiin tehtävät loppuun ja varmistettiin jatkot tarvittavilta osin.
- Tuotettu varhaisen vaiheen Nepsy-tiimimalli ja otettu käyttöön asiakasraati. Kehittämistyö jatkuu ja laajenee RRP2 hankkeessa.
- Tuotettu malli koululle jalkautuvasta mielenterveyspalvelusta ja konsultaatiokäytännöistä (jalkautuvat psyk hoitajat). Kehittämistyö jatkuu ja laajenee toiselle asteelle RRP2 hankkeessa.
- Tuotettu kuvaus mt hoidon porrastuksesta ja konsultaatiokäytännöistä. Kehittäminen jatkuu RRP2 hankkeessa.

NUORTEN PSYKOSOSIAALISET MENETELMÄT – NMOK (TULSOTE:ssa menetelmäkoordinaatio)

- Tuettu koordinaattorimallilla ja menetelmäohjauksilla menetelmien käyttöönottoa yhteistyössä koordinaatiohankkeen NMOK kehittäjien kanssa.

JÄRJESTÖ- JA OSALLISUUSYHTEISTYÖ

- Viimeisellä raportointikaudella vietiin tehtävät loppuun ja varmistettiin jatkot tarvittavilta osin.
- Tuotettu osallisuusohjelma (osallisuussalkku ja -työkalut)
- Tuotettu järjestöyhteistyön ohje, järjestöjen avustusperiaatteet ja -klinikat
- Tuotettu kokemusosaaja -toimintamalli
- Tuotettu kunnan, maakuntaliiton ja hva:n yhdyspintasopimus ja -suunnitelma

YHTEISTYÖ PALVELUTUOTANNON KANSSA

- Alettu toimimaan kumppanuusmallin mukaisesti, jossa omistajuus kehittämistyöstä on tuotannossa ja kehittäjät tuotannon tukena. Kumppanuusmallia jatketaan ja kehitetään edelleen uusissa hankkeissa.

HOITOON PÄÄSYN PARANTAMINEN

VASTAANOTTOPALVELUT, ENNALTAEHKÄISY JA MONIALAINEN TYÖ

- Käyttöönotettujen toimintamallien toiminta jatkuu suunnitellusti RRP2 hankkeen, tuottavuusohjelman rahoituksen ja palvelutuotannon omana työnä .
- Monialaisen mallin vaikuttavuuden seuranta RRP3 hankkeessa
- Haettu rahoitus RRP4 OmaTiimi-malliin joka kokoaa tässä tehdyn työn helmet alueellisesti yhdenmukaiseksi toiminnaksi.

VASTAANOTTOPALVELUJEN SELVITYS

- Selvitykset hyödynnetään tiedolla johtamisen ja palvelutoiminnan suunnittelun tukena

SÄHKÖINEN ASIOINTI JA DIGIHOITOPOLUT:

-Jatketaan digitaalisten palveluiden käytön laajentamista sekä jatkokehittämistä 2024–2025 erityisesti RRP2 hankkeessa. Lisäksi digitaalisten palveluiden valikoimaa kasvatetaan, ottamalla käyttöön mm. Omaperhe-palvelu ja oirearviopalvelu Omaolo sekä vahvistamalla ammattilaisten ja asukkaiden digirohkeutta ja digitaitoja.

LAPE

LASTEN JA PERHEIDEN ENNALTAEHKÄISEVÄ JA VARHAINEN TUKI ARKEEN

- Käyttöönotettujen toimintamallien laajentaminen jatkuu suunnitellusti RRP2 hankkeen, tuottavuusohjelman rahoituksen ja palvelutuotannon omana työnä.

MAKSUTTOMAN RASKAUDEN EHKÄISYN SELVITYS

-Hyödynnetään laadittua ohjeistusta seksuaaliterveysneuvonnan yhdenmukaistamiseksi seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän ohjauksessa .

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN TUKI JA HOITO

- Käyttöönotettujen toimintamallien laajentaminen jatkuu suunnitellusti RRP2 hankkeen, tuottavuusohjelman rahoituksen ja palvelutuotannon omana työnä.

NUORTEN PSYKOSOSIAALISET MENETELMÄT – NMOK (TULSOTE:ssa menetelmäkoordinaatio)

- Menetelmätuki jatkuu hva:n toimesta pysyvänä toimintana

IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTI, TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA MONIALAINEN KUNTOUTUS

-Käyttöönotettujen toimintamallien laajentaminen jatkuu suunnitellusti RRP2 hankkeen, tuottavuusohjelman rahoituksen ja palvelutuotannon omana toimintana.

- Selvitykset hyödynnetään tiedolla johtamisen ja jatkokehittämisen tukena.

JÄRJESTÖ- JA OSALLISUUSYHTEISTYÖ

- Ohjeet ja ohjelmat toimivat osallisuus- ja järjestöyhteistyön ja päätöksenteon tukena jatkossa.

VIESTINTÄ

- Viestintämateriaali on helposti saatavilla ja hyödynnettävissä tarpeen mukaan.

HANKEVOIMALA

- Jatkamme uusien hankkeiden parissa, hyödynnämme ja vahvistamme kertynyttä osaamista ja asiantuntemusta hanketyöstä ja kestävän muutoksen aikaansaamisesta sekä valmistelemme uusia hankkeita yhdessä tuotannon kanssa. Opimme tehdystä työstä ja kehitämme edelleen tapaamme toimia kestävän muutokset aikaansaamiseksi tiimissä ja koko hankevoimalayhteisössä kehittäjien kanssa.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp)

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

Taloudelliset hyödyt

‹ 2024 ›

Nimi	Tyyppi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä		0 €	0 €

VIESTINTÄ
- Hankkeen viestinnän materiaalin koonti.
- Tuotettu tuloksista viestinnällisesti toimiva yhteenvetoraportti ja podcastsarja sekä valtava määrä blogeja ja muuta viestintämateriaalia.
- Pidetty hankkeen tulosten loppukatselmus 12.12. sekä useita teemallisia alueellisia webinaareja.

HANKEHALLINTO -> HANKEVOIMALA
- Hankkeen päättämisen tehtävät.
- Tuotettiin hankkeiden toteutuksen, johtamisen ja hallinnoinnin palvelukonsepti Hankevoimala. Hankevoimalan tarkoitus on edistää kestävää muutosta. Se jatkaa toimintaansa hva:lla hankerahoituksen turvin.
- Tuotettu tutkimustietoa yhteistyössä UEF kanssa muutosvalmiuden vahvistamisesta.
- Vahvistettu hankehallinnon, hanketoimijoiden ja palvelutuotannon kehittäjien muutoskyvykkyyttä ja valmennusosaamista jatkuvan oppimisen ja kestävän muutoksen edistämisen tueksi, yht. 69 valmennettua.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur)

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	3 096 316 €	1 688 790 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot pl. LAPE	2 629 644 €	1 486 417 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot LAPE osuus	466 672 €	202 373 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukse	7 081 150 €	6 762 899 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut pl. LAPE	4 765 822 €	4 707 675 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut LAPE osuus	2 315 328 €	2 055 224 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	448 414 €	190 158 €	0 €	0 €
Muut kustannukset pl. LAPE	356 789 €	148 288 €	0 €	0 €
Muut kustannukset LAPE osı	91 625 €	41 870 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	**10 625 880 €**	**8 641 847 €**	**0 €**	**0 €**

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta
